

Foto Dokumentation - Die Entstehung des Hauses GHR 29

31.05.2012




01.06.2012





Kanalbau und Rigole

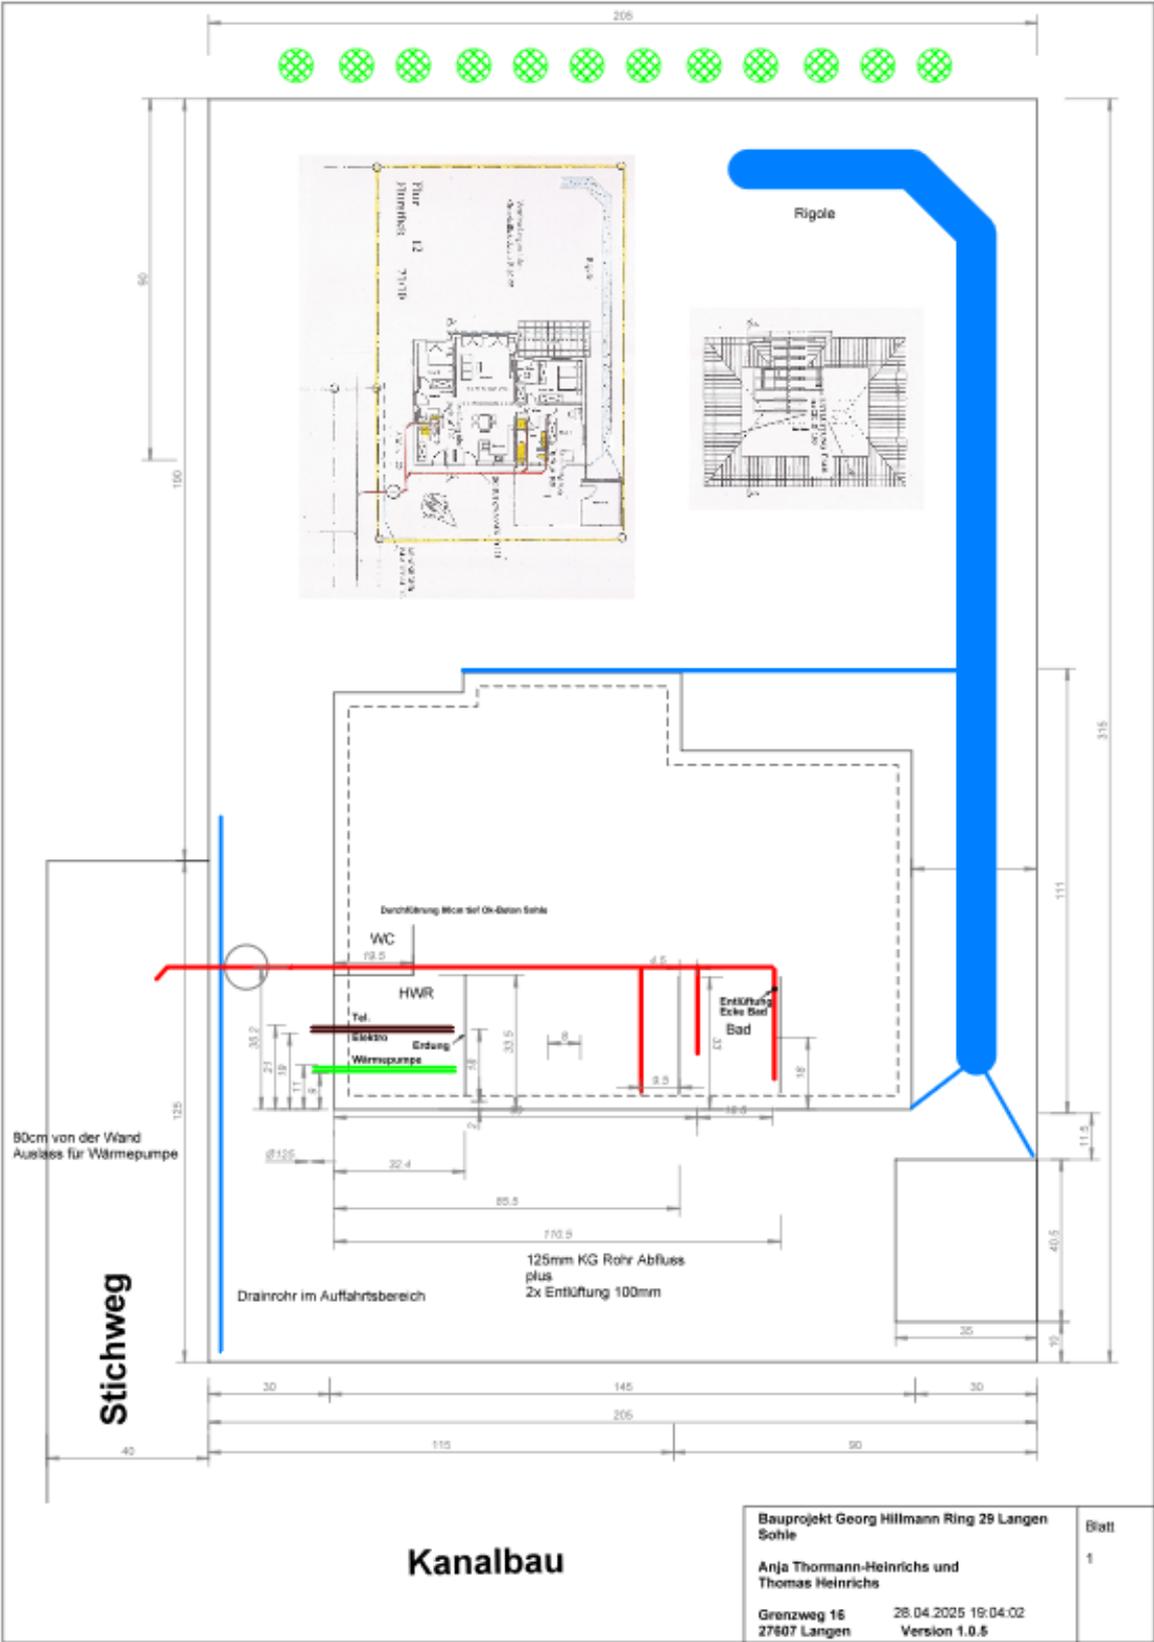

Kanalbau

Bauprojekt Georg Hillmann Ring 29 Langen
 Sohle
 Anja Thomann-Heinrichs und
 Thomas Heinrichs
 Grenzweg 16 28.04.2025 19:04:02
 27607 Langen Version 1.0.5

Blatt
 1










08.06.2012



10.06.2012

Isolierung und Armierungsarbeiten Sohle



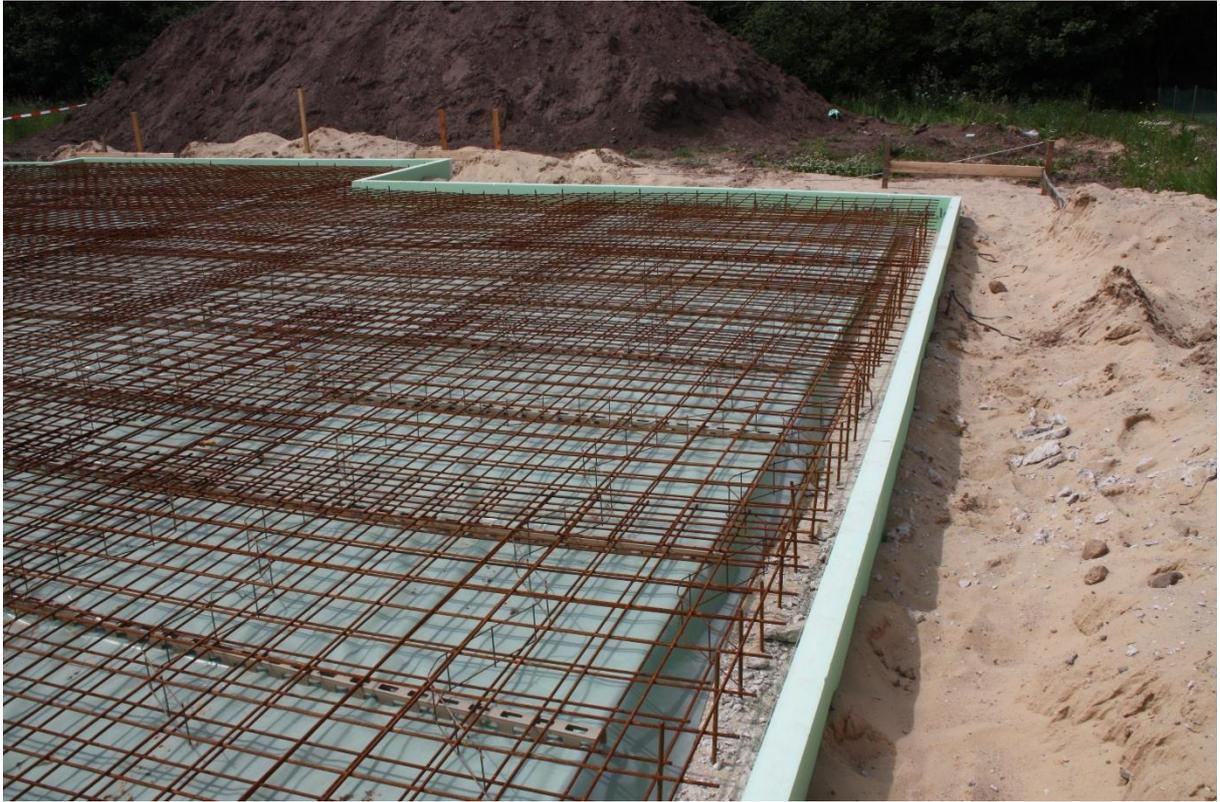

11.06.2012

Beton Sohle gießen







17.06.2012

Grundierung Sohle



18.06.2012

Haus Entstehung



22.06.2012

Vorbereitung Hausbau – Sohle mit Bitumbahn versiegelt



24.06.2012

Haus Transporter



25.06.2012

1. Hausbautag







26.06.2012

2. Hausbautag





29.06.2012

Richtfest



02.07.2012

Fenster Einbau







21.07.2012

Baufortschritt







27.07.2012

1. Isolierung Schicht Fussboden



01.-03.08.2012

Fußbodenheizung










29.08.2012

Baufortschritt



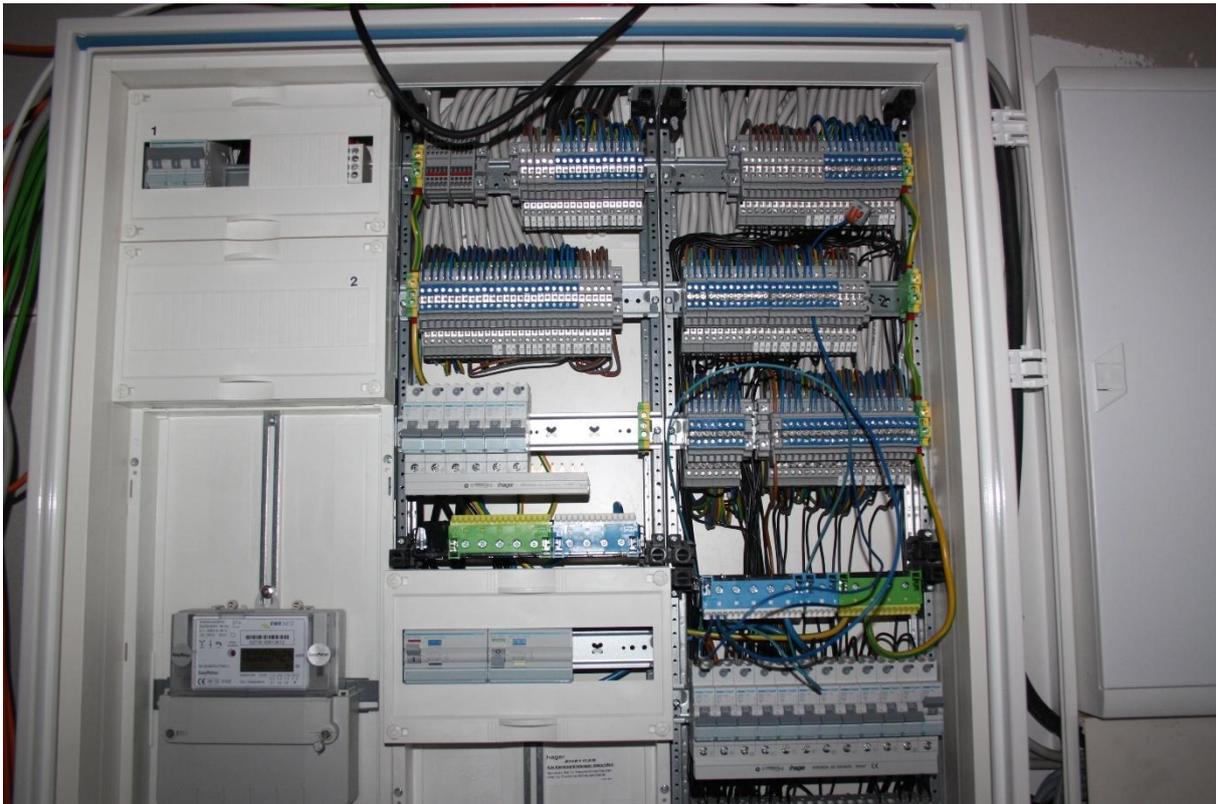

23.09.2012

Baufortschritt









Einzug 29.10.2012

Gartenzimmer

Frontansicht B Feld
von Innen gesehen links



3 Glasschiebe Einheiten

- A = 2683mm
- B = 2682mm
- C = 2140mm
- D = 2130mm


Frontansicht A Feld
von Innen gesehen rechts




3 Glasschiebe Einheiten

- E = 2681mm
- F = 2681mm
- G = 2138mm
- H = 2140mm

Frontansicht
von Außen gesehen

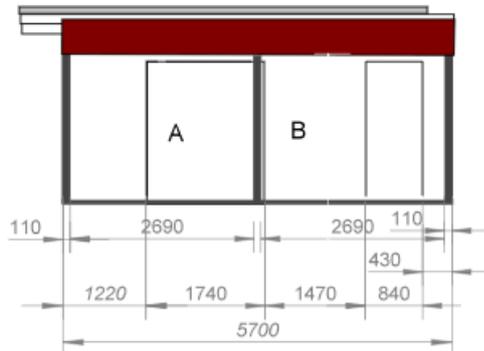

Seitenansicht 1
Position: linke Seite von Innen gesehen

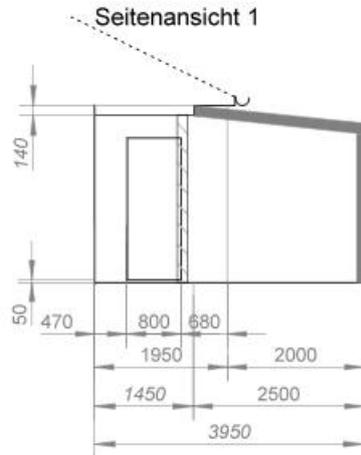

2 Glasschiebe Einheiten



A = 1877mm

B = 1872mm

C = 2138mm

D = 2400mm

Seitenansicht 2
Position: rechte Seite von Innen gesehen

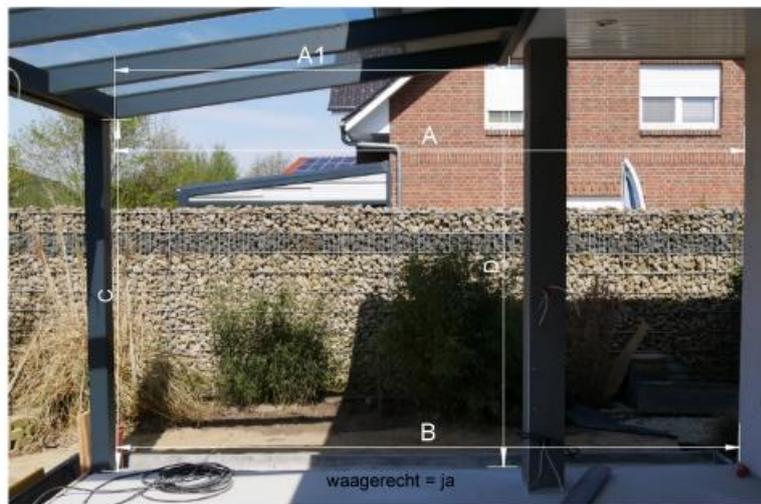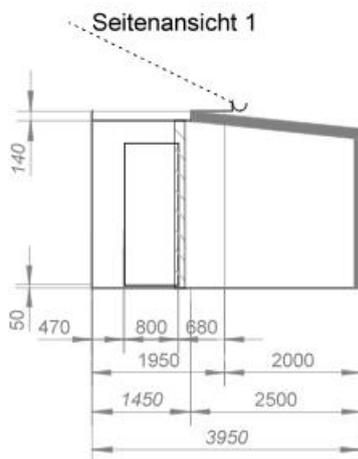

4 Glasschiebe Einheiten

A = 3819mm

B = 3819mm

C = 2142mm

D = 2459mm

A1 = 2385mm



17.03.2018



01.04.2018



06.04.2018



09.04.2018



08.09.2018




Sauna Bau August – Dezember 2022

Historie

Unter Projekt Gabione 2022 - 2023:
Sichtschutz im GHR Frontbereich wird ersetzt gegen Gabione



- 04.12.2021 Beste Möglichkeit ohne unnötige Investitionen zu tätigen, das bestehende Gartenhaus zu nutzen
- 05.12.2021 Konstruktionsbeginn, Kalkulation Vorlage, Zeichnungen sichten
- 22.08.2022 Gartenhaus komplett aufgeräumt, eine Hälfte frei gemacht und Tür umbgebaut, aus der Idee geht es in die Umsetzung
- 23-26.08.2022 Schnittplan für Kalkulation und Mengengerüst berechnet, Kalkulierte Kosten 6.961,91 EUR 25.08.2022 Erste Bestellungen in Splate eingepflegt und Angebot Phase 1
- 7.09.2022 Seitenwand weg genommen; Pflasterarbeiten 10.09.; Elektrokabel im Außenbereich verlegt 11.09.2022;
- 17.09.2022 Dachpappe und Tiefgrund gekauft bei Obi und Tiefgrund aufgetragen.
- 18.09.2022 Dachpappe auf Boden vorgelegt
- 19.09.2022 Dachpappe aufgeschweißt
- 20.09.2022 Dachständerwerk vorne demontiert und Messungen durchgeführt für Schnittrarbeiten
- 21.09.2022 Säge bekommen, begonnen Ständerwerk aufzubauen, Seiten- & Innenständerwerk fertig
- 22.09.2022 Außenhaut Seite Raupund aufgebracht, OSB Platten für die Innenwand montieren
- 23.09.2022 Restmaterialbeschaffung Dachlatten, Raupund, Dichtungsmaterial Bitum
- 01.10.2022 Balken für Sitzbank und Eckverstärkung eingebaut, Decken Balken befestigt, Boden gereinigt, versiegelt, Isoliert, Folie verlegt und 3 OSB Platten zugeschnitten
- 03.10.2022 E-Leitungen verlegt
- 13.10.2022 Ecken und Undichtigkeiten versiegelt
- 15.10.2022 Boden mit Dampfsperreband abgedichtet, Ausschnitte für Be- und Entlüftung hergestellt. Vor dem Eingang Vorarbeiten für Pflaster Arbeiten
- 16.10.2022 begonnen zu Isolieren
- 28.10.2022 Elektro Verteilung
- 30.10.2022 zuerst isoliert und Aluminium Folie mit Anja aufgebracht und verklebt
- 05.11.2022 OSB Platte fertig verlegt, Jack Board aufgeschraubt
- 07.11.2022 Fliesen gelegt 1. Teil
- 11.11.2022 Sauna Holz ist heute geliefert worden
- 12.11.2022 Rest Fliesen geschritten, Unterkonstruktion begonnen zu montieren, Decke mit Espenholz Panele 2/3 gelegt
- 13.11.2022 Fliesen kleben
- 14.11.2022 Unterkonstruktion weiter montiert und Fliesen verfugt
- 15.11.2022 Unterkonstruktion
- 19.11.2022 Espe Panele mit Jo-Ann verlegt
- 20.11.2022 Espe Panele weiter verlegt
- 21.11.2022 Espe Panele links unter Steinwand montiert
- 26.11.2022 Rückwand Schräge Espe Panele montiert und Kabelkanal außen
- 03.12.2022 Esce Panele komplett fertig
- 05.12.2022 Schiefer Wand Start 09:46 Ende 12:10 Uhr
- 06.12.2022 Bänke gebaut und eingebaut
- Wago SW zum laufen gebracht
- 07.12.2022 E-Installation HWR Sauna kabel angeschlossen UVT 3 fertig
- 08.12.2022 Rückenlehne gebaut und montiert mit Jo-Ann, UVT 7 und UVT 8 verkabelt
- 09.12.2022 Rückenlehne Bank gebaut und Stelzen / Füße montiert, Sauna Ofen angeschlossen
- 10.12.2022 Inbetriebnahme
- 11.12.2022 Erster Sauna Gang
- Anschluss Ofen noch mal naheverbessert



Holz = Abachi- oder Espenholz
Bei der Inneneinrichtung der Sauna, also den Sitzbänken, Lehnen und Kopfstützen sollte man auf besonders hochwertiges, splitter- und harzfreies Holz achten, dass die Wärme nur gering leitet. Abachi- oder Espenholz sind eine gute Wahl.

